

# 根室市新庁舎建設かわら版

新庁舎完成までの進捗状況

基本構想 基本計画 基本設計 実施設計 建設工事  
R2.3 策定 R2.11 策定 R3.2 策定 R4.3 策定 現在 ●●●●●

R4.5~R4.7 新庁舎準備工事  
R4.7~R6.3 新庁舎建設工事  
R6.6~R6.10 現庁舎解体工事  
R6.10~R7.7 現庁舎改修・外構工事

R6.5~  
新庁舎  
供用開始

外構準備工事・附属建物解体工事が完了しました

R4.5~R4.7 外構準備工事

… バス停車帯移設、緑地帯撤去、樹木移植、  
来庁者用駐車場整備ほか

① 着工前の庁舎前庭



② 緑地帯の一部を撤去



③ 樹木の移植



移植後のチシマザクラ

移植後の  
チシマザクラ・シコタンマツ

④ 緑地帯跡の整地



⑤ 緑地帯跡の舗装



⑥ 駐車区画線の整備 完成



R4.5~R4.7 附属建物解体工事

… 車庫兼書庫・倉庫解体工事、解体工事に伴う電気・機械設備工事、コンテナ移設など



## 新庁舎建設工事のお知らせ


新庁舎の建設工事が始まり、下図のような仮囲い（**緑色のライン**）が設置されました。仮囲いの設置により、**前庭の来庁者用駐車場は一部が使用できなくなるほか、車両動線が下記のように変更となります**。来庁者の皆さまにはご不便、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。なお、来庁者用駐車場の出入口及び現庁舎の正面玄関・地下玄関はこれまでどおりご利用いただけます。



※ゲートを開放している場合も立入禁止です

## 新庁舎建設後の工事スケジュールについて


本年7月に着手した新庁舎建設工事は令和6年3月頃に完了し、同年5月頃に新庁舎が供用開始となります。新庁舎の供用開始後は現庁舎の解体・改修工事に取り掛かり、その後、駐車場整備などの外構工事を行い、令和7年7月頃に新庁舎建設にかかる全ての工事が完了する予定です。

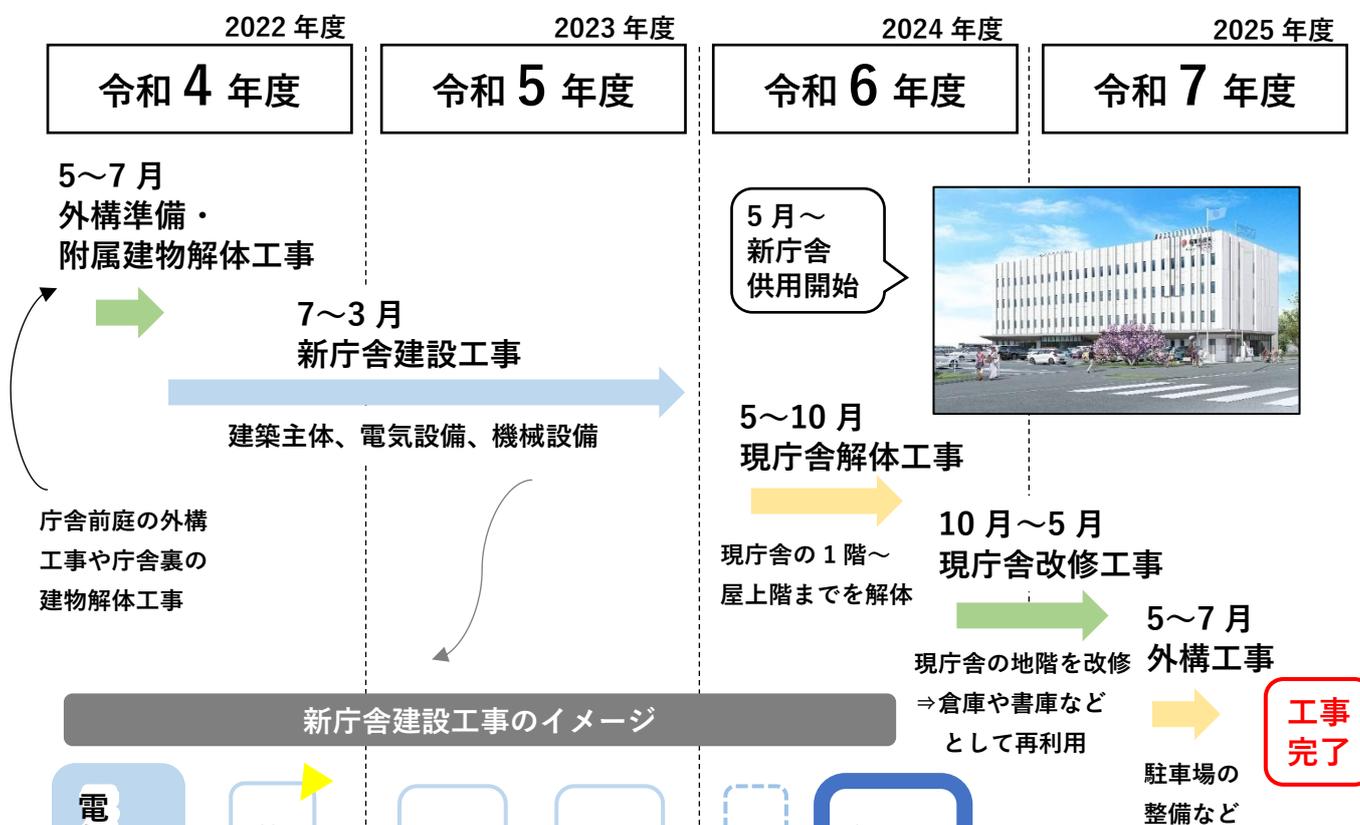

工事の豆知識


### 基礎とは？

鉄筋コンクリートの土台で、地面と建物の間を繋ぐ重要な役割を担っています。



### 躯体とは？

建物の主要な構造部をつくる骨組みのことで、柱や梁、壁や床などのことです。

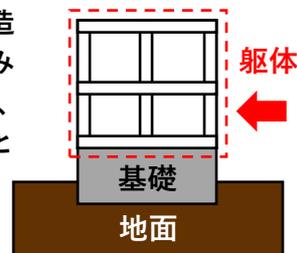

### 根室市総務部庁舎整備推進課

電話 0153-23-6111 (内線 2239)  
FAX 0153-24-8692

市ホームページでは工事のお知らせや進捗状況などを更新しています！

